ORGANISMO/COMITÉ/ÁREA/PROGRAMA: Proyecto Integrador de Octavo Semestre – Proyecto CIP 2026-2			
ACTA No: 4	**FECHA:** 15 de Octubre de 2026	**HORA:** 8:00 a.m.	**LUGAR:** Sala de Automatización

OBJETIVOS:

- Integrar el trabajo de todos los integrantes en el prototipo
- Ensamblar la estructura del prototipo y montar los tanques
- Revisar el avance de la parte de control

ASISTENTES:

Participantes:

Estudiante Fabian Augusto Ruiz
Estudiante Ferney Leonardo Patiño
Estudiante Yulieth Gutiérrez Quintero
Estudiante Karen Cecilia Villaronga
Estudiante Joseph Santiago Suárez
Estudiante Karen Johanna García
Estudiante Julián Santiago Jiménez
Estudiante Germán Yesid Gómez
Estudiante Juan Camilo Díaz

AGENDA DEL DÍA:

- Integración general del trabajo de los integrantes
- Ensamblaje de la estructura de los carros del prototipo
- Montaje de los tanques y del circuito hidráulico
- Revisión de la parte de control
- Definición de actividades para la siguiente jornada

Desarrollo de la jornada:

Se realizó una jornada de trabajo conjunto con la participación de todos los integrantes del equipo, con el propósito de integrar los avances individuales en el prototipo del sistema CIP portátil.

Integración de la estructura y montaje de tanques

Se ensambló la estructura de los carros del prototipo y se montaron sobre ella los tanques y los elementos del circuito hidráulico, verificando su ubicación según el diseño.


Se decidió utilizar una bomba sumergible para realizar la agitación del agua y el jabón en el tanque en lugar de utilizar un agitador para evitar problemas con el eje.

Revisión de la parte de control

Se revisó el avance de la parte de control del prototipo, incluyendo la medición de temperatura y la conexión de los actuadores con el PLC, y se definieron los ajustes pendientes.

Se acordó continuar al día siguiente con el montaje de la caja eléctrica y las pruebas de funcionamiento de las bombas.

Pruebas

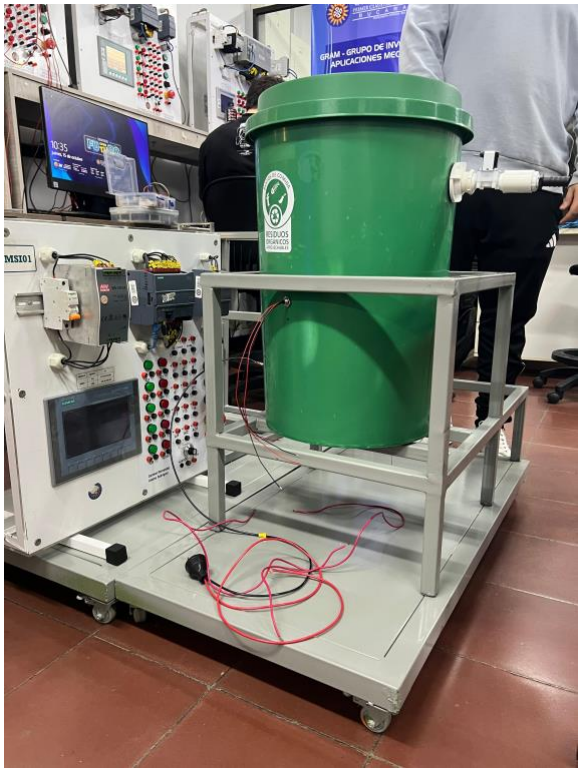



Repositorio del proyecto: https://github.com/nicami13/Proyecto_CIP_2026-2


COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA
Montar la caja eléctrica del tablero	Todos los integrantes	16/10/2026
Realizar las pruebas de funcionamiento de las bombas	Todos los integrantes	16/10/2026
Integrar los avances del montaje en el documento del proyecto	Karen Cecilia Villaronga, Karen Johanna García	16/10/2026

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES:
Se verifica el cumplimiento de las tareas individuales y de las compras pendientes conforme a los compromisos establecidos en el Acta No. 3.


EN CONSTANCIA FIRMAN LOS ASISTENTES:



Fabian Augusto Ruiz
C.C.: 1102488558




Ferney Leonardo Patiño
C.C.: 1095303447



Yulieth Gutiérrez Quintero
C.C.: 1097094588



Karen Cecilia Villaronga
C.E.: 1017371



Joseph Santiago Suárez
C.C.: 1116778915



Karen Johanna García
C.C.: 1031805175



Julián Santiago Jiménez
C.C.: 1097782748



Germán Yesid Gómez
C.C.: 1005163865



Juan Camilo Díaz
C.C.: 1097488722
